


# СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (I ЭТАП) М 1:200

Леруа Мерлен  
"Химки"

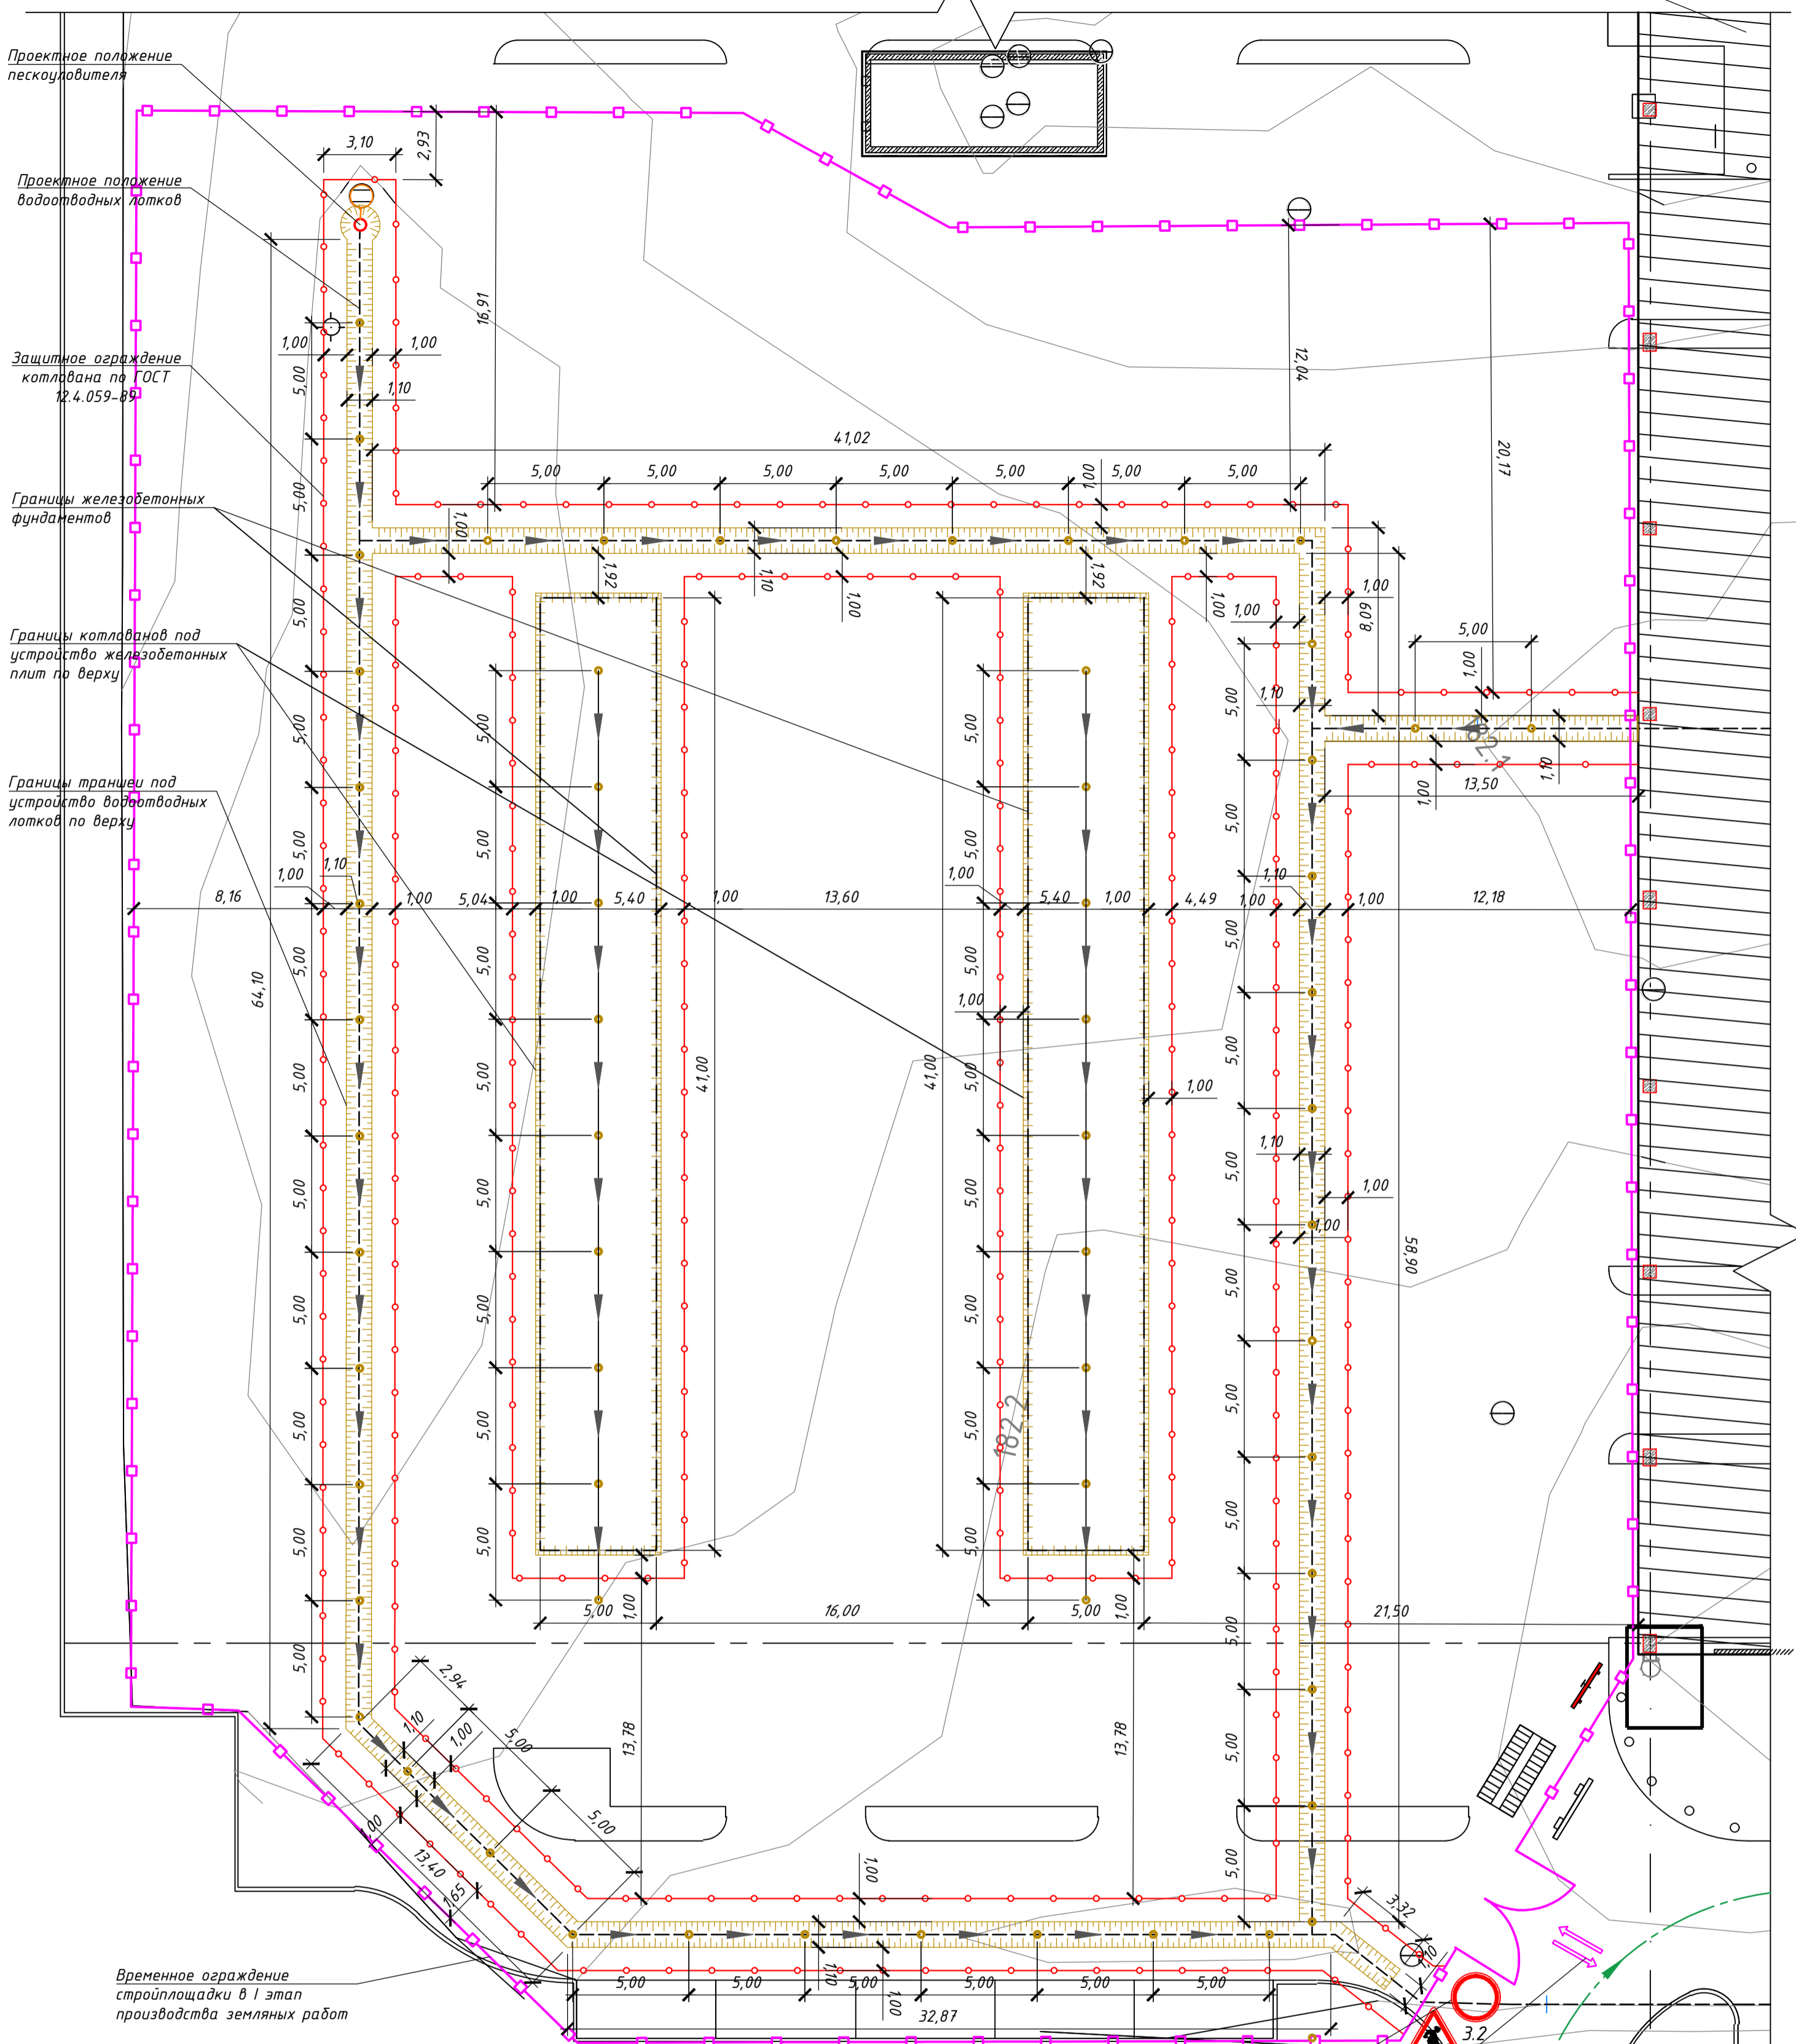

## ПРИМЕЧАНИЕ

При производстве работ принимать меры против промерзания и обводнения грунтов оснований, руководствоваться указаниями СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) и СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87).  
По периметру траншей и котлованов выполнить защитное ограждение по ГОСТ 12.4.059-89.  
Разработанный грунт с погрузкой трактором-экскаватором в автотранспорт полностью вывозить за пределы строительной площадки во временные места складирования, на расстояние до 23 км, с последующим транспортированием грунта для обратной засыпки в необходимом объеме.  
Объем разработанного грунта котлованов под железобетонные плиты - 287,0 м<sup>3</sup>.  
Объем разработанного грунта траншей под устройство водоотводных лотков на I этапе производства земляных работ - 206,8 м<sup>3</sup>.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Существующее здание "Леруа Мерлен" "Химки"		Стоянка экскаватора
	Граница проектируемых железобетонных фундаментов		Путь движения экскаватора
	Проектируемые водоотводные лотки		Граница траншей по верху
	Временное ограждение стройплощадки		Щит с реквизитами и транспортной схемой
	Стенд с противопожарным инвентарем		Дорожный знак 1.25 "Дорожные работы"
	Ограждение мест производства работ		Дорожный знак 3.2 "Движение запрещено"
	Щит с реквизитами и транспортной схемой		Пункт мойки колес автотранспорта

Дорожный знак 3.2  
"Движение запрещено"

Дорожный знак 1.25  
"Дорожные работы"

Въезд/выезд на  
стройплощадку

Ось движения автомобилей  
клиентов Леруа Мерлен

18-04/19-ППР

Парковка торгового центра "Леруа Мерлен" (Химки), расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая вл. 20 с. 1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработ		Шевченко			
Директор		Петренко			

Земляные работы

Схема производства земляных работ (I этап) М 1:200

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Инженерное бюро  
ООО "Фил. Проект"

Формат А2

Взам.инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.
